PDF-XChange Click to buy NOW! www.docu-track.com

ID	Task Name	Duration	Start	Predeces
1	Rene sur la montagne	15 days	Thu 13.11.08	
2	Michel sur la montagne	15 days?	Thu 13.11.08	
3	Charles	27 days?	Thu 13.11.08	
4	Gilles	18 days?	Sat 22.11.08	
5	Francois	18 days?	Sat 22.11.08	
6	Luc	1 day?	Tue 11.11.08	
7	Francesco	7 days?	Thu 04.12.08	
8	Vincent I	11 days?	Mon 10.11.08	
9	Vincent II	10 days?	Mon 01.12.08	
10				
11	deballer	2 days?	Mon 10.11.08	
12	**cablage**	**6.5 days**	**Fri 14.11.08**	**11**
13	cablage informatique	3 days	Fri 14.11.08	
14	cablage connecteurs	1 day	Mon 17.11.08	13
15	cablage 220V PISCO	0.5 days	Tue 18.11.08	14
16				
17	zero coupole	0.5 days	Fri 14.11.08	
18	camera C2 (filtre CZ)	0.5 days	Thu 20.11.08	
19	Instal dispositif de nettoyage M1 CO2	2 days	Fri 14.11.08	17
20	Usinage raccord détendeur + test netl	1 day	Sun 16.11.08	19
21	**T4**	**25 days**	**Tue 11.11.08**	
22	installer et adapter les PCs	2 days	Tue 11.11.08	
23	integration reglage	1 day	Thu 13.11.08	22
24	installer le PC service dans le rack	1 day	Fri 14.11.08	22
25	tester les I/O service	2 days	Sat 15.11.08	24
26	tester les fonctions service	2 days	Mon 17.11.08	25
27	tester les action sous timing	1 day	Wed 19.11.08	26
28	installer le REM + MGC	3 days	Thu 20.11.08	14
29	tester les I/O reglage	2 days	Sun 23.11.08	28
30	tester les I/O optique	1 day	Tue 25.11.08	29
31	tester les fonctions regalge	2 days	Wed 26.11.08	30
32	tester les fonctions optique	2 days	Fri 28.11.08	31
33	tester l'acquisition et la poursuite	2 days	Sun 30.11.08	32
34	cut-off	0 days	Sun 07.12.08	
35				
36	**pisco**	**21 days**	**Thu 13.11.08**	**11**
37	test equilibrage telescope	0.5 days	Thu 13.11.08	
38	montage/cablage PICSO (sur table)	0.5 days	Wed 19.11.08	
39	installation des filtres	0.5 days	Wed 19.11.08	38
40	test optique	0.5 days	Thu 20.11.08	39
41	test sur table SW	0.5 days	Thu 20.11.08	40
42	installer PISCO sur le telescope	1 day	Sun 23.11.08	41
43	cablage PISCO	1 day	Mon 24.11.08	42
44	pre-equilibrage PISCO	0.5 days	Tue 25.11.08	43
45	test sur le ciel	2 days	Tue 02.12.08	33

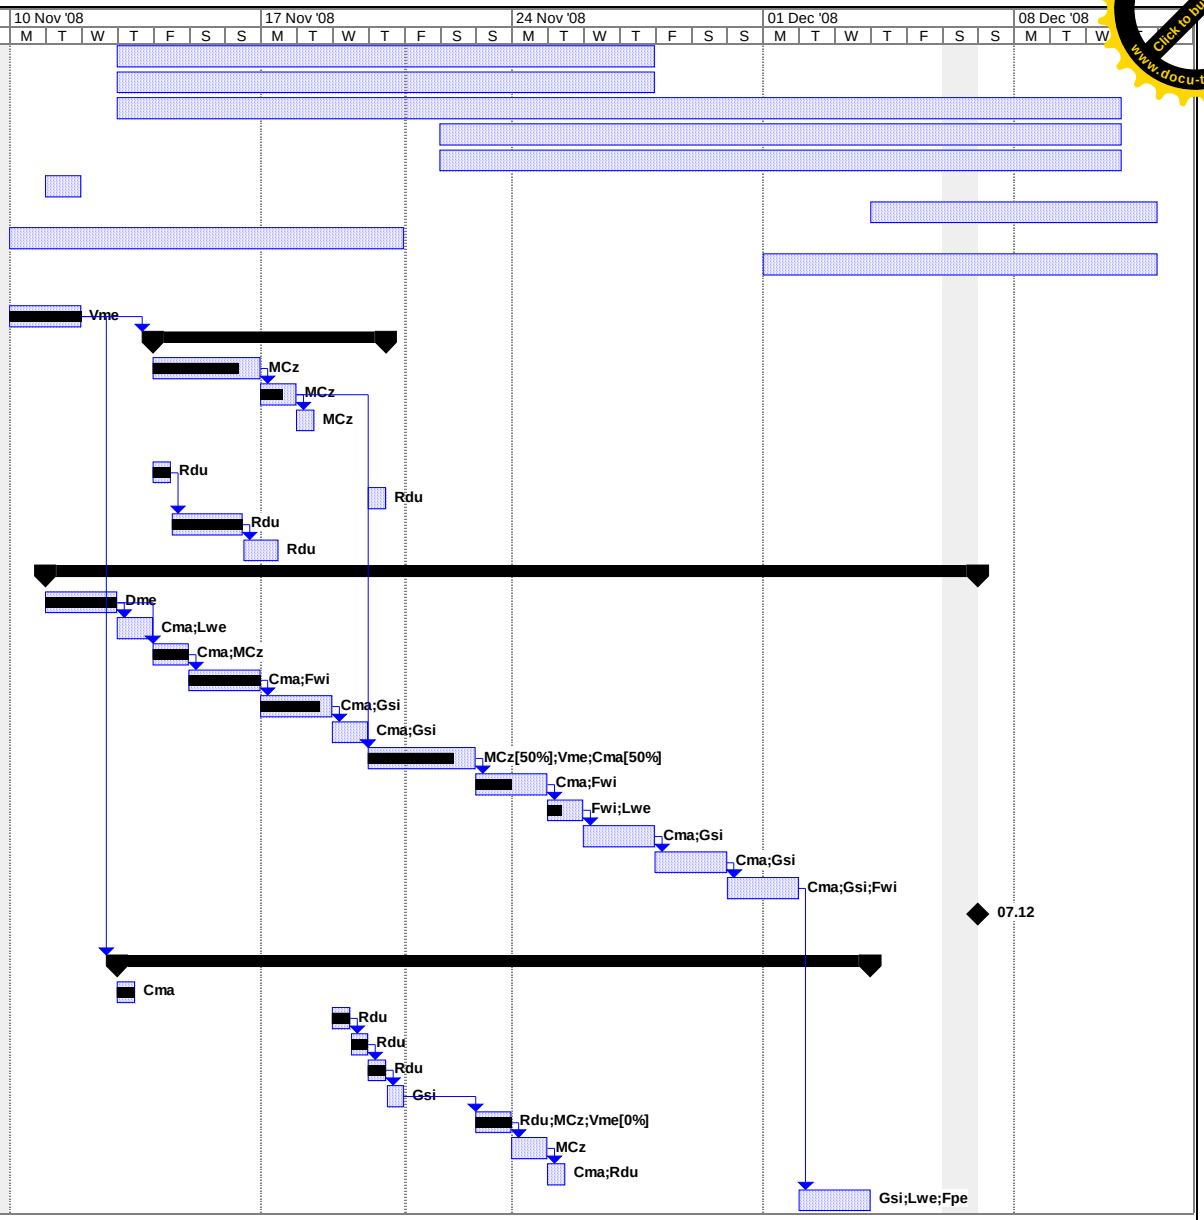

Project: Project1
Date: Fri 21.11.08

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone
